


Eigen firma

Renovatie 48 woningen Tuinwijk | Voorbeeldlaan 1, 9000 Gent · Gent · Opdrachtgever: Bouwheer (voorbeeld) | 48 geselecteerde werkeenheden

Gefaseerde productieplanner

Alle fases, weken en statussen | 10 okt 2026, 10:39



STATUSVERDELING




Productiebelasting per week

Aantal geplande werkeenheden in de huidige selectie.



Werkpakketvolgorde

Vaste productiestappen, ploeg en standaardduur.



99%

PLANBETROUWBAARHEID
123 van 124 vervallen stappen klaar

1

ACHTER OP SCHEMA
1 stappen over hun einddatum

0

VANDAAG IN UITVOERING
stappen op 10/10/2026

1 d


GROOTSTE ACHTERSTAND
1 geblokkeerde stappen

30/11/2026

EINDE PRODUCTIE
prognose 01/12/2026

Ritmeplanning (line of balance)

Werkeenheden in productievolgorde (verticaal) tegen de tijd (horizontaal). Elke kleur is een werkpakket; evenwijdige lijnen = stabiel ritme.

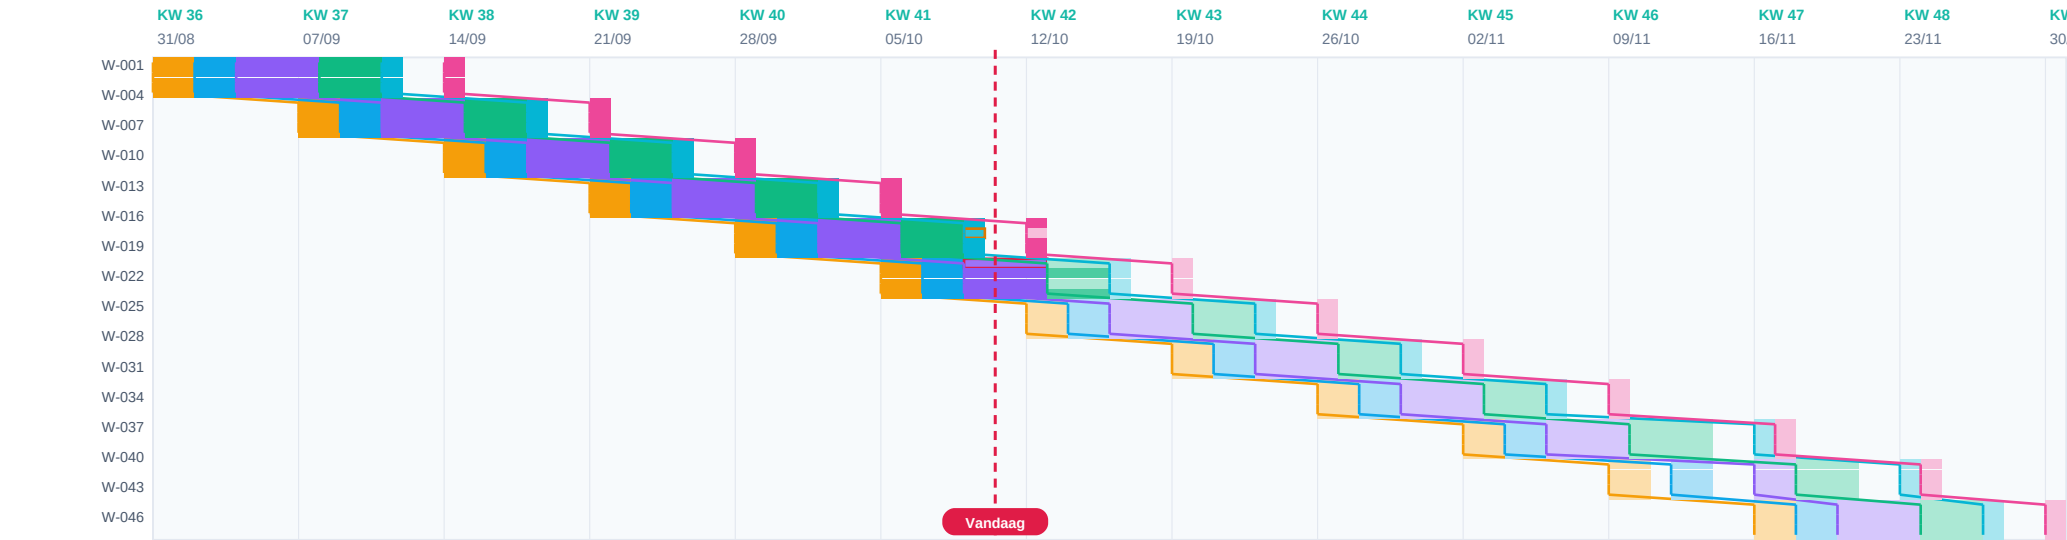


1. Afbraak & voorbereiding 2. Leidingen & technieken 3. Pleister & herstel 4. Hoofduitvoering 5. Aansluitingen & afkitten 6. Controle & oplevering

Licht = gepland, vol = klaar, oranje rand = achter op schema, rode rand = geblokkeerd.

WERKPAKKET	PLOEG / ONDERAANNEMER	KLAAR	BEZIG	ACHTER	GEBLOKKEERD	VOLGENDE START
1. Afbraak & voorbereiding	Afbraakploeg	24/48 (50%)	0	0	0	12/10/2026
2. Leidingen & technieken	Technieken	24/48 (50%)	0	0	0	14/10/2026
3. Pleister & herstel	Afwerking	23/48 (48%)	0	0	1	16/10/2026
4. Hoofduitvoering	Uitvoeringsploeg	20/48 (42%)	2	0	0	13/10/2026
5. Aansluitingen & afkitten	Technieken	19/48 (40%)	0	1	0	16/10/2026
6. Controle & oplevering	Werfleiding	19/48 (40%)	0	0	0	12/10/2026

Visuele faseplanning per kalenderdag

Exacte werkdatums per fase. Weekends, feestdagen en werfsluitingen blijven zichtbaar en verschuiven de productie.

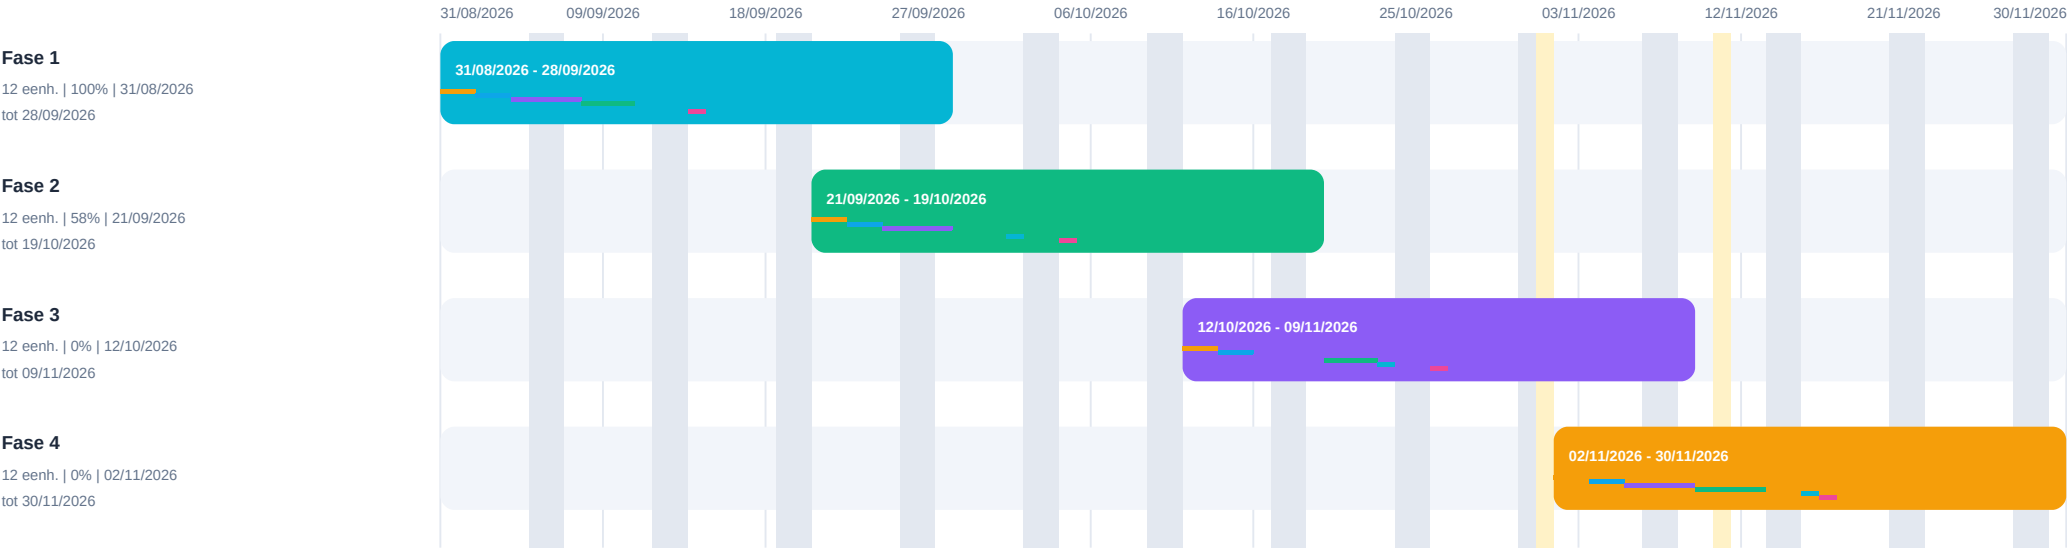

Werkpakketvolgorde

1. Afbraak & voorbereiding

2. Leidingen & technieken

3. Pleister & herstel

4. Hoofduitvoering

5. Aansluitingen & afkitten

6. Controle & oplevering

Niet-werkdagen


Weekend

Feestdag

Vakantie / sluiting


Visuele planning per werkeenheid

Iedere woning met huisnummer/code, volledig adres, fase, exacte werkperiode en alle genummerde werkpakketten.

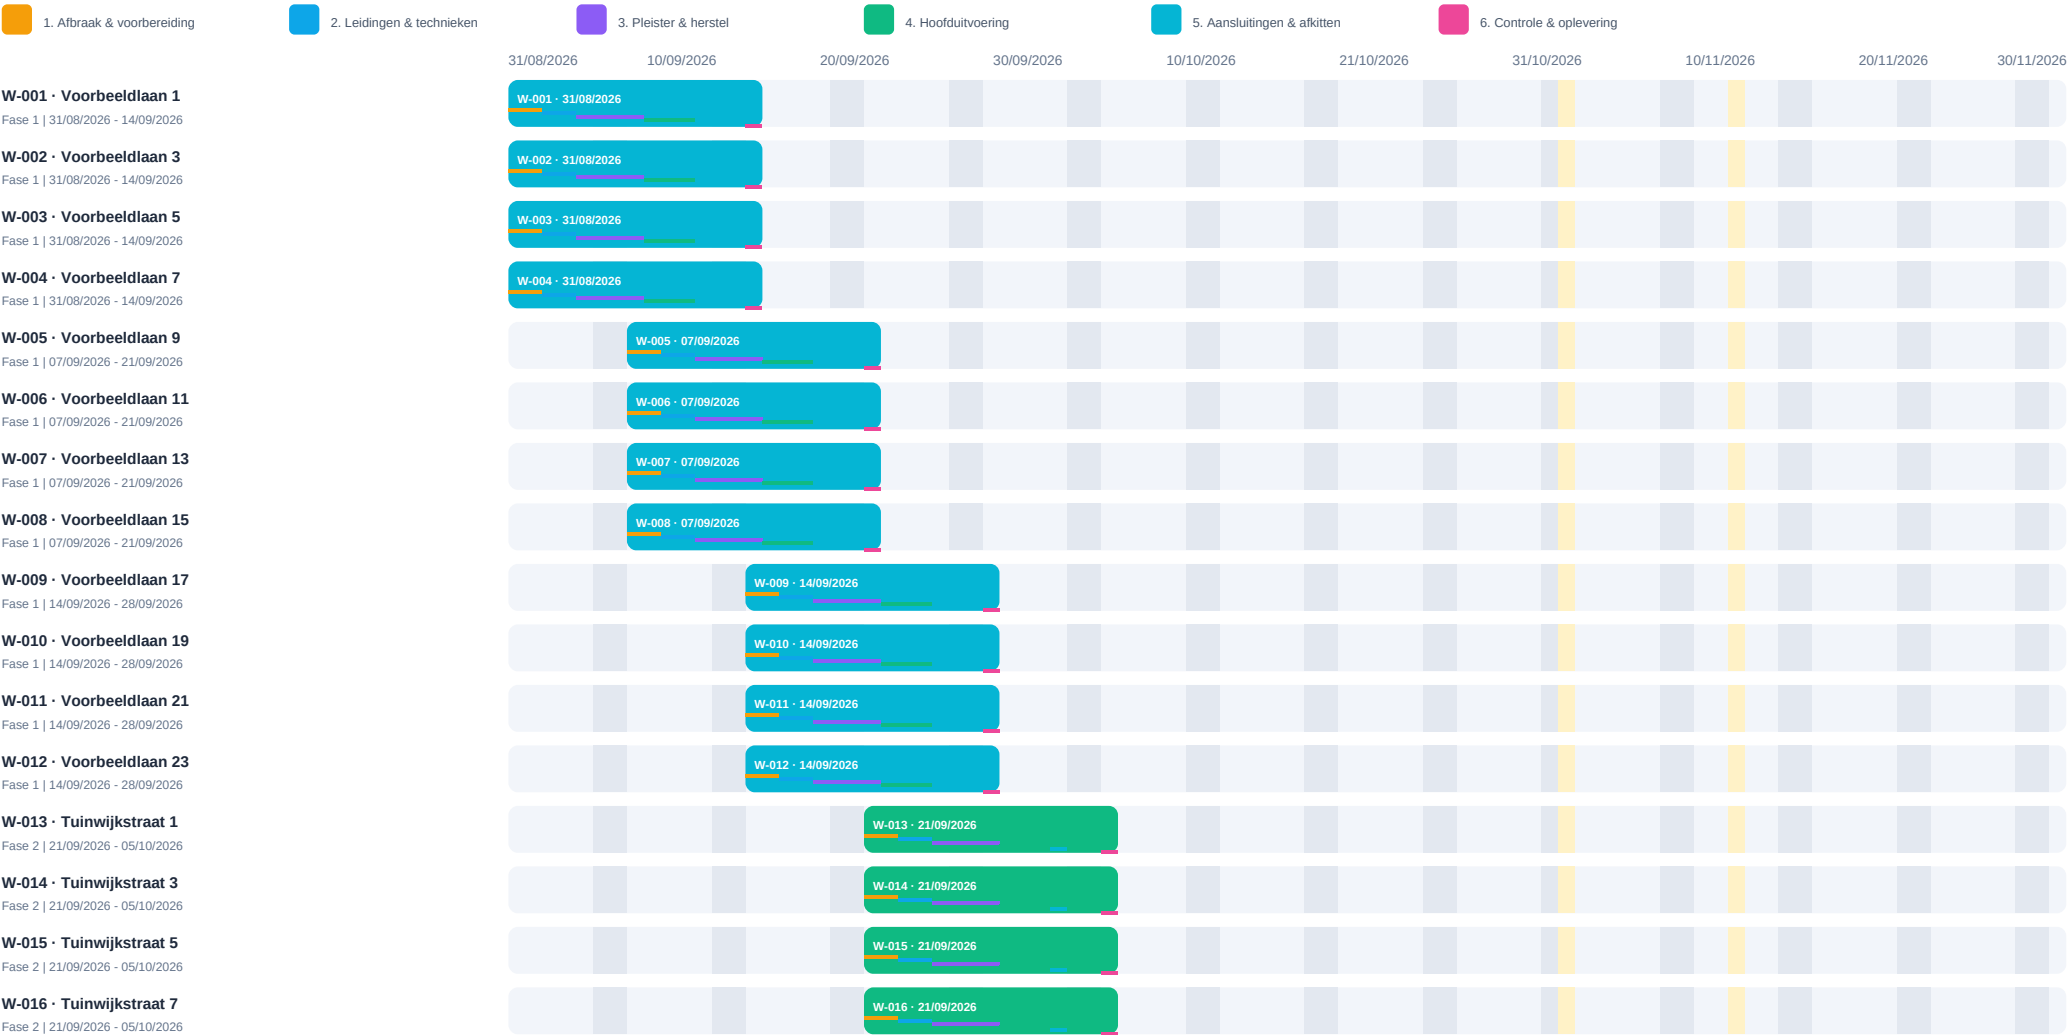


Visuele planning per werkeenheid

Iedere woning met huisnummer/code, volledig adres, fase, exacte werkperiode en alle genummerde werkpakketten.

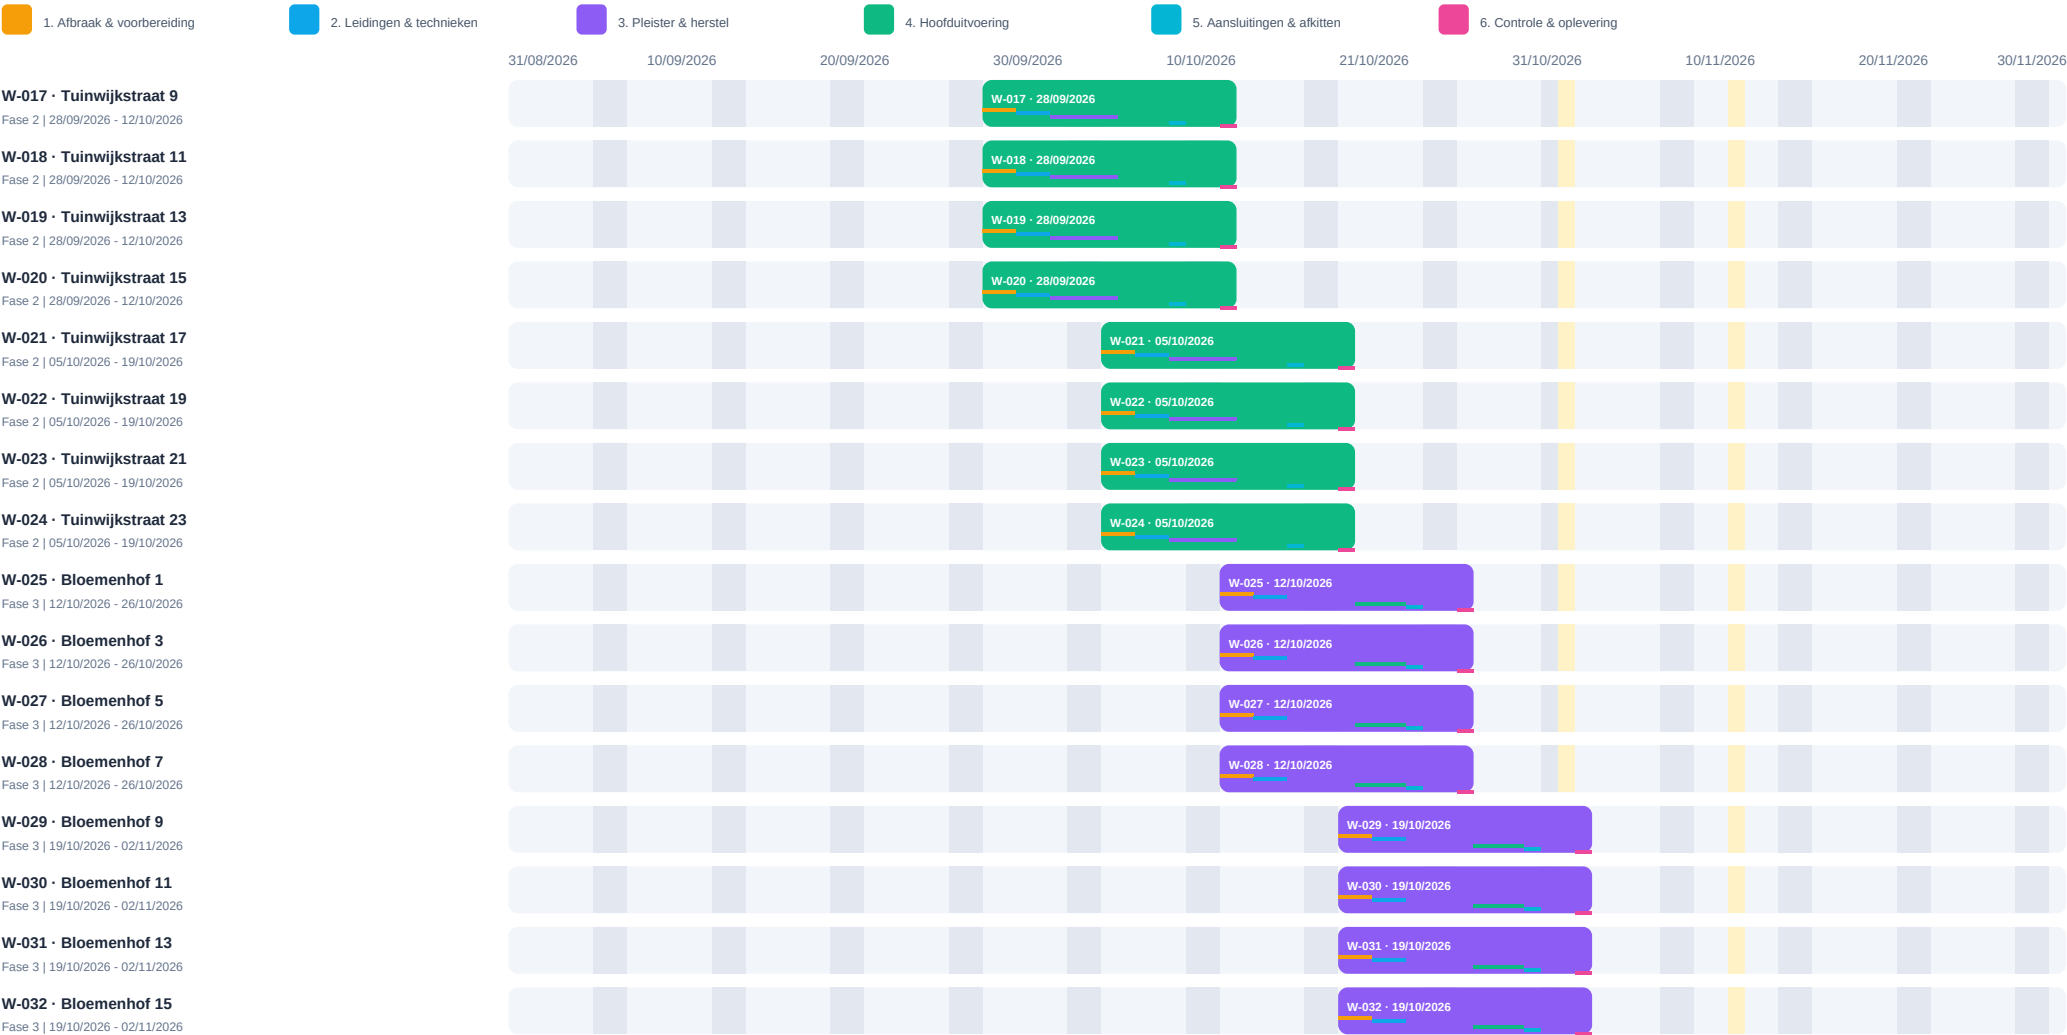

Visuele planning per werkeenheid

Iedere woning met huisnummer/code, volledig adres, fase, exacte werkperiode en alle genummerde werkpakketten.

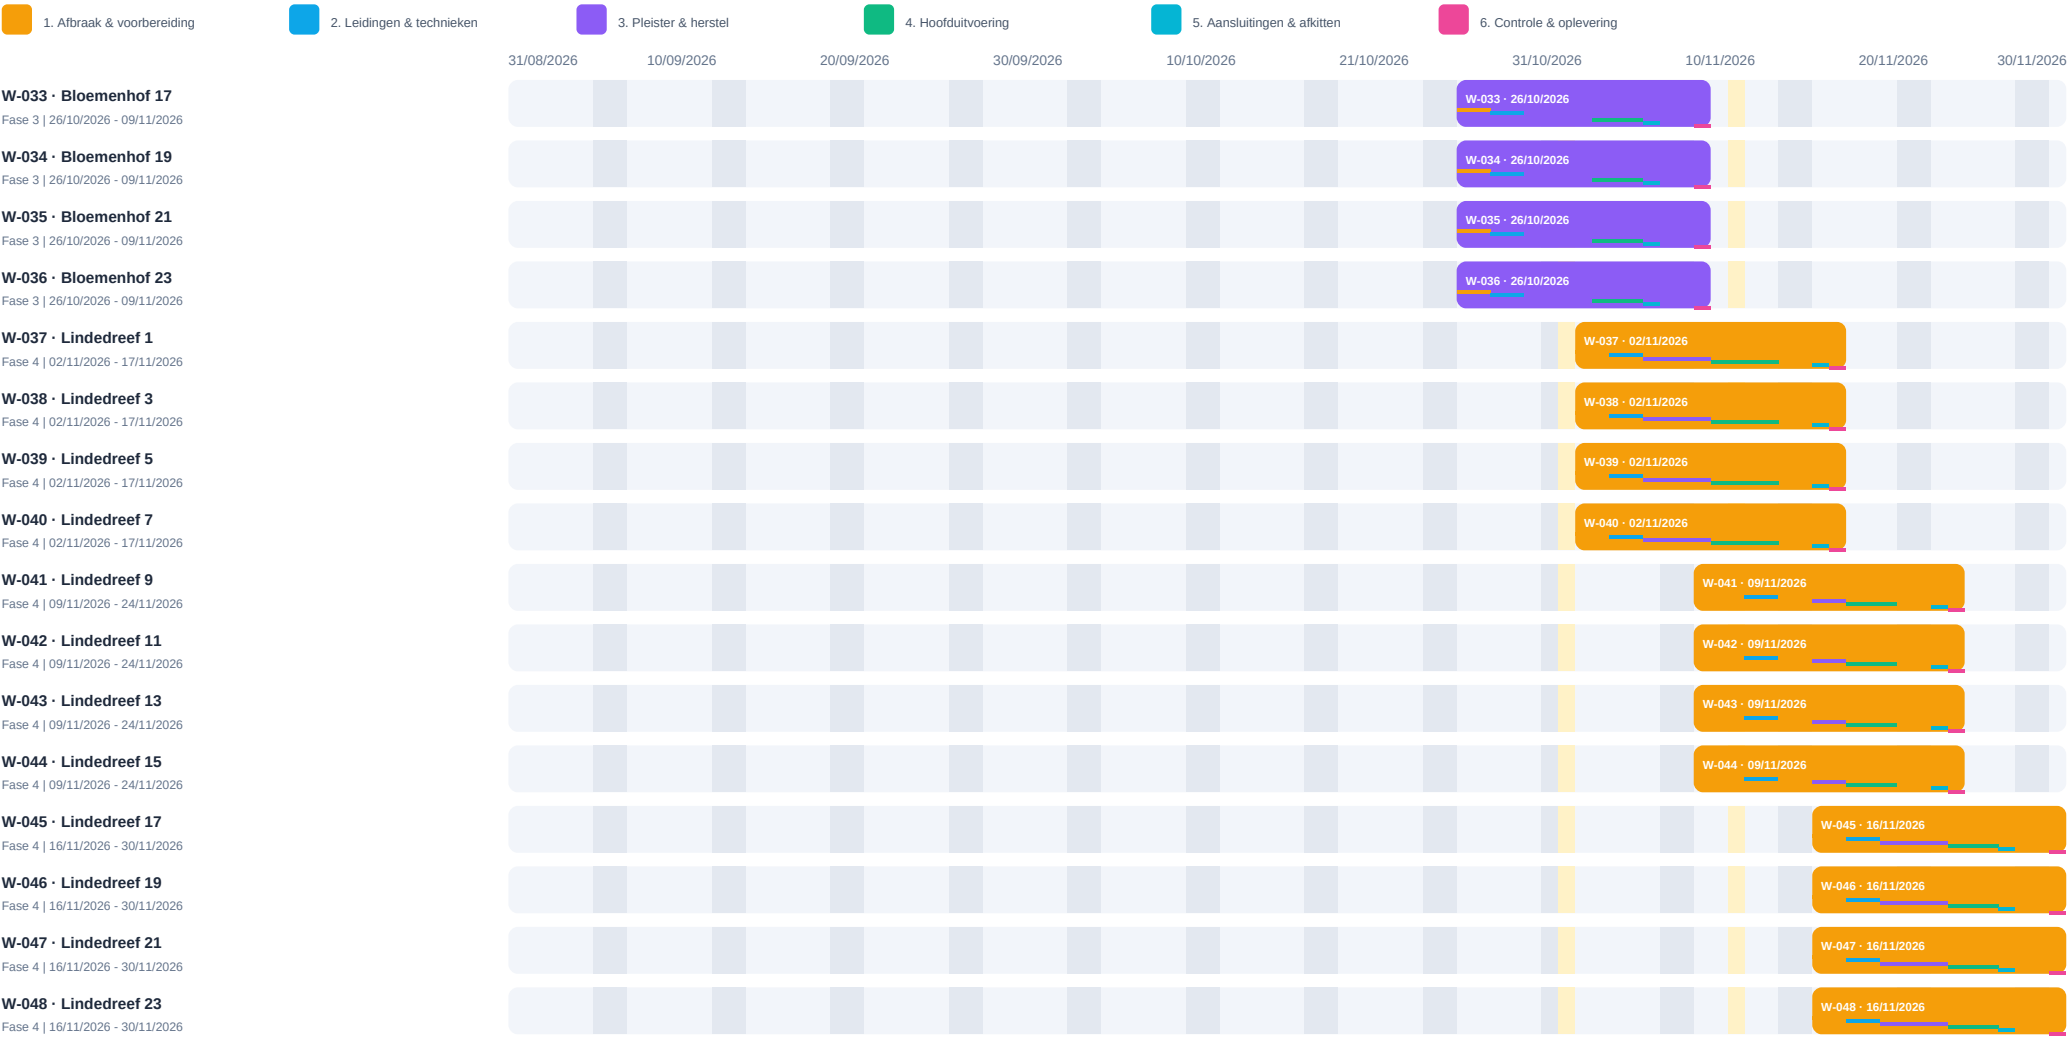

Werkpakketten per werkeenheid

Iedere productiestap met exacte kalenderdatum, duur, ploeg en actuele status.

CODE	LOCATIE	FASE	START	1. Afbraak & voorbereiding	2. Leidingen & technieken	3. Pleister & herstel	4. Hoofduitvoering	5. Aansluitingen & afkitten	6. Controle & oplevering
				Afbraakploeg · 2d · start +0	Technieken · 2d · na vorig pakket	Afwerking · 2d · na vorig pakket	Uitvoeringsploeg · 3d · na vorig	Technieken · 1d · na vorig pakket	Werfleiding · 1d · na vorig pakket
W-001	Voorbeeldlaan 1	Fase 1	31/08/2026	31/08/2026 Klaar 2d	02/09/2026 Klaar 2d	04/09/2026 Klaar 2d	08/09/2026 Klaar 3d	11/09/2026 Klaar 1d	14/09/2026 Klaar 1d
W-002	Voorbeeldlaan 3	Fase 1	31/08/2026	31/08/2026 Klaar 2d	02/09/2026 Klaar 2d	04/09/2026 Klaar 2d	08/09/2026 Klaar 3d	11/09/2026 Klaar 1d	14/09/2026 Klaar 1d
W-003	Voorbeeldlaan 5	Fase 1	31/08/2026	31/08/2026 Klaar 2d	02/09/2026 Klaar 2d	04/09/2026 Klaar 2d	08/09/2026 Klaar 3d	11/09/2026 Klaar 1d	14/09/2026 Klaar 1d
W-004	Voorbeeldlaan 7	Fase 1	31/08/2026	31/08/2026 Klaar 2d	02/09/2026 Klaar 2d	04/09/2026 Klaar 2d	08/09/2026 Klaar 3d	11/09/2026 Klaar 1d	14/09/2026 Klaar 1d
W-005	Voorbeeldlaan 9	Fase 1	07/09/2026	07/09/2026 Klaar 2d	09/09/2026 Klaar 2d	11/09/2026 Klaar 2d	15/09/2026 Klaar 3d	18/09/2026 Klaar 1d	21/09/2026 Klaar 1d
W-006	Voorbeeldlaan 11	Fase 1	07/09/2026	07/09/2026 Klaar 2d	09/09/2026 Klaar 2d	11/09/2026 Klaar 2d	15/09/2026 Klaar 3d	18/09/2026 Klaar 1d	21/09/2026 Klaar 1d
W-007	Voorbeeldlaan 13	Fase 1	07/09/2026	07/09/2026 Klaar 2d	09/09/2026 Klaar 2d	11/09/2026 Klaar 2d	15/09/2026 Klaar 3d	18/09/2026 Klaar 1d	21/09/2026 Klaar 1d
W-008	Voorbeeldlaan 15	Fase 1	07/09/2026	07/09/2026 Klaar 2d	09/09/2026 Klaar 2d	11/09/2026 Klaar 2d	15/09/2026 Klaar 3d	18/09/2026 Klaar 1d	21/09/2026 Klaar 1d
W-009	Voorbeeldlaan 17	Fase 1	14/09/2026	14/09/2026 Klaar 2d	16/09/2026 Klaar 2d	18/09/2026 Klaar 2d	22/09/2026 Klaar 3d	25/09/2026 Klaar 1d	28/09/2026 Klaar 1d
W-010	Voorbeeldlaan 19	Fase 1	14/09/2026	14/09/2026 Klaar 2d	16/09/2026 Klaar 2d	18/09/2026 Klaar 2d	22/09/2026 Klaar 3d	25/09/2026 Klaar 1d	28/09/2026 Klaar 1d
W-011	Voorbeeldlaan 21	Fase 1	14/09/2026	14/09/2026 Klaar 2d	16/09/2026 Klaar 2d	18/09/2026 Klaar 2d	22/09/2026 Klaar 3d	25/09/2026 Klaar 1d	28/09/2026 Klaar 1d
W-012	Voorbeeldlaan 23	Fase 1	14/09/2026	14/09/2026 Klaar 2d	16/09/2026 Klaar 2d	18/09/2026 Klaar 2d	22/09/2026 Klaar 3d	25/09/2026 Klaar 1d	28/09/2026 Klaar 1d
W-013	Tuinwijkstraat 1	Fase 2	21/09/2026	21/09/2026 Klaar 2d	23/09/2026 Klaar 2d	25/09/2026 Klaar 2d	29/09/2026 Klaar 3d	02/10/2026 Klaar 1d	05/10/2026 Klaar 1d
W-014	Tuinwijkstraat 3	Fase 2	21/09/2026	21/09/2026 Klaar 2d	23/09/2026 Klaar 2d	25/09/2026 Klaar 2d	29/09/2026 Klaar 3d	02/10/2026 Klaar 1d	05/10/2026 Klaar 1d
W-015	Tuinwijkstraat 5	Fase 2	21/09/2026	21/09/2026 Klaar 2d	23/09/2026 Klaar 2d	25/09/2026 Klaar 2d	29/09/2026 Klaar 3d	02/10/2026 Klaar 1d	05/10/2026 Klaar 1d

CODE	LOCATIE	FASE	START	1. Afbraak & voorbereiding	2. Leidingen & technieken	3. Pleister & herstel	4. Hoofduitvoering	5. Aansluitingen & afkitten	6. Controle & oplevering
				Afbraakploeg · 2d · start +0	Technieken · 2d · na vorig pakket	Afwerking · 2d · na vorig pakket	Uitvoeringsploeg · 3d · na vorig	Technieken · 1d · na vorig pakket	Werfleiding · 1d · na vorig pakket
W-016	Tuinwijkstraat 7	Fase 2	21/09/2026	21/09/2026 Klaar 2d	23/09/2026 Klaar 2d	25/09/2026 Klaar 2d	29/09/2026 Klaar 3d	02/10/2026 Klaar 1d	05/10/2026 Klaar 1d
W-017	Tuinwijkstraat 9	Fase 2	28/09/2026	28/09/2026 Klaar 2d	30/09/2026 Klaar 2d	02/10/2026 Klaar 2d	06/10/2026 Klaar 3d	09/10/2026 Klaar 1d	12/10/2026 Klaar 1d
W-018	Tuinwijkstraat 11	Fase 2	28/09/2026	28/09/2026 Klaar 2d	30/09/2026 Klaar 2d	02/10/2026 Klaar 2d	06/10/2026 Klaar 3d	09/10/2026 Gepland 1d	12/10/2026 Gepland 1d
W-019	Tuinwijkstraat 13	Fase 2	28/09/2026	28/09/2026 Klaar 2d	30/09/2026 Klaar 2d	02/10/2026 Klaar 2d	06/10/2026 Klaar 3d	09/10/2026 Klaar 1d	12/10/2026 Klaar 1d
W-020	Tuinwijkstraat 15	Fase 2	28/09/2026	28/09/2026 Klaar 2d	30/09/2026 Klaar 2d	02/10/2026 Klaar 2d	06/10/2026 Klaar 3d	09/10/2026 Klaar 1d	12/10/2026 Klaar 1d
W-021	Tuinwijkstraat 17	Fase 2	05/10/2026	05/10/2026 Klaar 2d	07/10/2026 Klaar 2d	09/10/2026 Geblokkeerd 2d	13/10/2026 Gepland 3d	16/10/2026 Gepland 1d	19/10/2026 Gepland 1d
W-022	Tuinwijkstraat 19	Fase 2	05/10/2026	05/10/2026 Klaar 2d	07/10/2026 Klaar 2d	09/10/2026 Klaar 2d	13/10/2026 Bezig 3d	16/10/2026 Gepland 1d	19/10/2026 Gepland 1d
W-023	Tuinwijkstraat 21	Fase 2	05/10/2026	05/10/2026 Klaar 2d	07/10/2026 Klaar 2d	09/10/2026 Klaar 2d	13/10/2026 Gepland 3d	16/10/2026 Gepland 1d	19/10/2026 Gepland 1d
W-024	Tuinwijkstraat 23	Fase 2	05/10/2026	05/10/2026 Klaar 2d	07/10/2026 Klaar 2d	09/10/2026 Klaar 2d	13/10/2026 Bezig 3d	16/10/2026 Gepland 1d	19/10/2026 Gepland 1d
W-025	Bloemenhof 1	Fase 3	12/10/2026	12/10/2026 Gepland 2d	14/10/2026 Gepland 2d	16/10/2026 Gepland 2d	20/10/2026 Gepland 3d	23/10/2026 Gepland 1d	26/10/2026 Gepland 1d
W-026	Bloemenhof 3	Fase 3	12/10/2026	12/10/2026 Gepland 2d	14/10/2026 Gepland 2d	16/10/2026 Gepland 2d	20/10/2026 Gepland 3d	23/10/2026 Gepland 1d	26/10/2026 Gepland 1d
W-027	Bloemenhof 5	Fase 3	12/10/2026	12/10/2026 Gepland 2d	14/10/2026 Gepland 2d	16/10/2026 Gepland 2d	20/10/2026 Gepland 3d	23/10/2026 Gepland 1d	26/10/2026 Gepland 1d
W-028	Bloemenhof 7	Fase 3	12/10/2026	12/10/2026 Gepland 2d	14/10/2026 Gepland 2d	16/10/2026 Gepland 2d	20/10/2026 Gepland 3d	23/10/2026 Gepland 1d	26/10/2026 Gepland 1d
W-029	Bloemenhof 9	Fase 3	19/10/2026	19/10/2026 Gepland 2d	21/10/2026 Gepland 2d	23/10/2026 Gepland 2d	27/10/2026 Gepland 3d	30/10/2026 Gepland 1d	02/11/2026 Gepland 1d
W-030	Bloemenhof 11	Fase 3	19/10/2026	19/10/2026 Gepland 2d	21/10/2026 Gepland 2d	23/10/2026 Gepland 2d	27/10/2026 Gepland 3d	30/10/2026 Gepland 1d	02/11/2026 Gepland 1d
W-031	Bloemenhof 13	Fase 3	19/10/2026	19/10/2026 Gepland 2d	21/10/2026 Gepland 2d	23/10/2026 Gepland 2d	27/10/2026 Gepland 3d	30/10/2026 Gepland 1d	02/11/2026 Gepland 1d

CODE	LOCATIE	FASE	START	1. Afbraak & voorbereiding	2. Leidingen & technieken	3. Pleister & herstel	4. Hoofduitvoering	5. Aansluitingen & afkitten	6. Controle & oplevering
				Afbraakploeg - 2d - start +0	Technieken - 2d - na vorig pakket	Afwerking - 2d - na vorig pakket	Uitvoeringsploeg - 3d - na vorig	Technieken - 1d - na vorig pakket	Werfleiding - 1d - na vorig pakket
W-032	Bloemenhof 15	Fase 3	19/10/2026	19/10/2026 Gepland 2d	21/10/2026 Gepland 2d	23/10/2026 Gepland 2d	27/10/2026 Gepland 3d	30/10/2026 Gepland 1d	02/11/2026 Gepland 1d
W-033	Bloemenhof 17	Fase 3	26/10/2026	26/10/2026 Gepland 2d	28/10/2026 Gepland 2d	30/10/2026 Gepland 2d	03/11/2026 Gepland 3d	06/11/2026 Gepland 1d	09/11/2026 Gepland 1d
W-034	Bloemenhof 19	Fase 3	26/10/2026	26/10/2026 Gepland 2d	28/10/2026 Gepland 2d	30/10/2026 Gepland 2d	03/11/2026 Gepland 3d	06/11/2026 Gepland 1d	09/11/2026 Gepland 1d
W-035	Bloemenhof 21	Fase 3	26/10/2026	26/10/2026 Gepland 2d	28/10/2026 Gepland 2d	30/10/2026 Gepland 2d	03/11/2026 Gepland 3d	06/11/2026 Gepland 1d	09/11/2026 Gepland 1d
W-036	Bloemenhof 23	Fase 3	26/10/2026	26/10/2026 Gepland 2d	28/10/2026 Gepland 2d	30/10/2026 Gepland 2d	03/11/2026 Gepland 3d	06/11/2026 Gepland 1d	09/11/2026 Gepland 1d
W-037	Lindedreef 1	Fase 4	02/11/2026	02/11/2026 Gepland 2d	04/11/2026 Gepland 2d	06/11/2026 Gepland 2d	10/11/2026 Gepland 3d	16/11/2026 Gepland 1d	17/11/2026 Gepland 1d
W-038	Lindedreef 3	Fase 4	02/11/2026	02/11/2026 Gepland 2d	04/11/2026 Gepland 2d	06/11/2026 Gepland 2d	10/11/2026 Gepland 3d	16/11/2026 Gepland 1d	17/11/2026 Gepland 1d
W-039	Lindedreef 5	Fase 4	02/11/2026	02/11/2026 Gepland 2d	04/11/2026 Gepland 2d	06/11/2026 Gepland 2d	10/11/2026 Gepland 3d	16/11/2026 Gepland 1d	17/11/2026 Gepland 1d
W-040	Lindedreef 7	Fase 4	02/11/2026	02/11/2026 Gepland 2d	04/11/2026 Gepland 2d	06/11/2026 Gepland 2d	10/11/2026 Gepland 3d	16/11/2026 Gepland 1d	17/11/2026 Gepland 1d
W-041	Lindedreef 9	Fase 4	09/11/2026	09/11/2026 Gepland 2d	12/11/2026 Gepland 2d	16/11/2026 Gepland 2d	18/11/2026 Gepland 3d	23/11/2026 Gepland 1d	24/11/2026 Gepland 1d
W-042	Lindedreef 11	Fase 4	09/11/2026	09/11/2026 Gepland 2d	12/11/2026 Gepland 2d	16/11/2026 Gepland 2d	18/11/2026 Gepland 3d	23/11/2026 Gepland 1d	24/11/2026 Gepland 1d
W-043	Lindedreef 13	Fase 4	09/11/2026	09/11/2026 Gepland 2d	12/11/2026 Gepland 2d	16/11/2026 Gepland 2d	18/11/2026 Gepland 3d	23/11/2026 Gepland 1d	24/11/2026 Gepland 1d
W-044	Lindedreef 15	Fase 4	09/11/2026	09/11/2026 Gepland 2d	12/11/2026 Gepland 2d	16/11/2026 Gepland 2d	18/11/2026 Gepland 3d	23/11/2026 Gepland 1d	24/11/2026 Gepland 1d
W-045	Lindedreef 17	Fase 4	16/11/2026	16/11/2026 Gepland 2d	18/11/2026 Gepland 2d	20/11/2026 Gepland 2d	24/11/2026 Gepland 3d	27/11/2026 Gepland 1d	30/11/2026 Gepland 1d
W-046	Lindedreef 19	Fase 4	16/11/2026	16/11/2026 Gepland 2d	18/11/2026 Gepland 2d	20/11/2026 Gepland 2d	24/11/2026 Gepland 3d	27/11/2026 Gepland 1d	30/11/2026 Gepland 1d
W-047	Lindedreef 21	Fase 4	16/11/2026	16/11/2026 Gepland 2d	18/11/2026 Gepland 2d	20/11/2026 Gepland 2d	24/11/2026 Gepland 3d	27/11/2026 Gepland 1d	30/11/2026 Gepland 1d

Werkpakketplanning 1 / 1				Renovatie 48 woningen Tuinwijk 10 okt 2026, 10:39					
CODE	LOCATIE	FASE	START	1. Afbraak & voorbereiding	2. Leidingen & technieken	3. Pleister & herstel	4. Hoofduitvoering	5. Aansluitingen & afkitten	6. Controle & oplevering
				Afbraakploeg - 2d - start +0	Technieken - 2d - na vorig pakket	Afwerking - 2d - na vorig pakket	Uitvoeringsploeg - 3d - na vorig	Technieken - 1d - na vorig pakket	Werfleiding - 1d - na vorig pakket
W-048	Lindedreef 23	Fase 4	16/11/2026	16/11/2026 Gepland 2d	18/11/2026 Gepland 2d	20/11/2026 Gepland 2d	24/11/2026 Gepland 3d	27/11/2026 Gepland 1d	30/11/2026 Gepland 1d
