


16 KOPPELINGEN · 10 PROBLEEMEN · 5 ...



16 KOPPELINGEN · 10 PROBLEEMEN · 5 ...

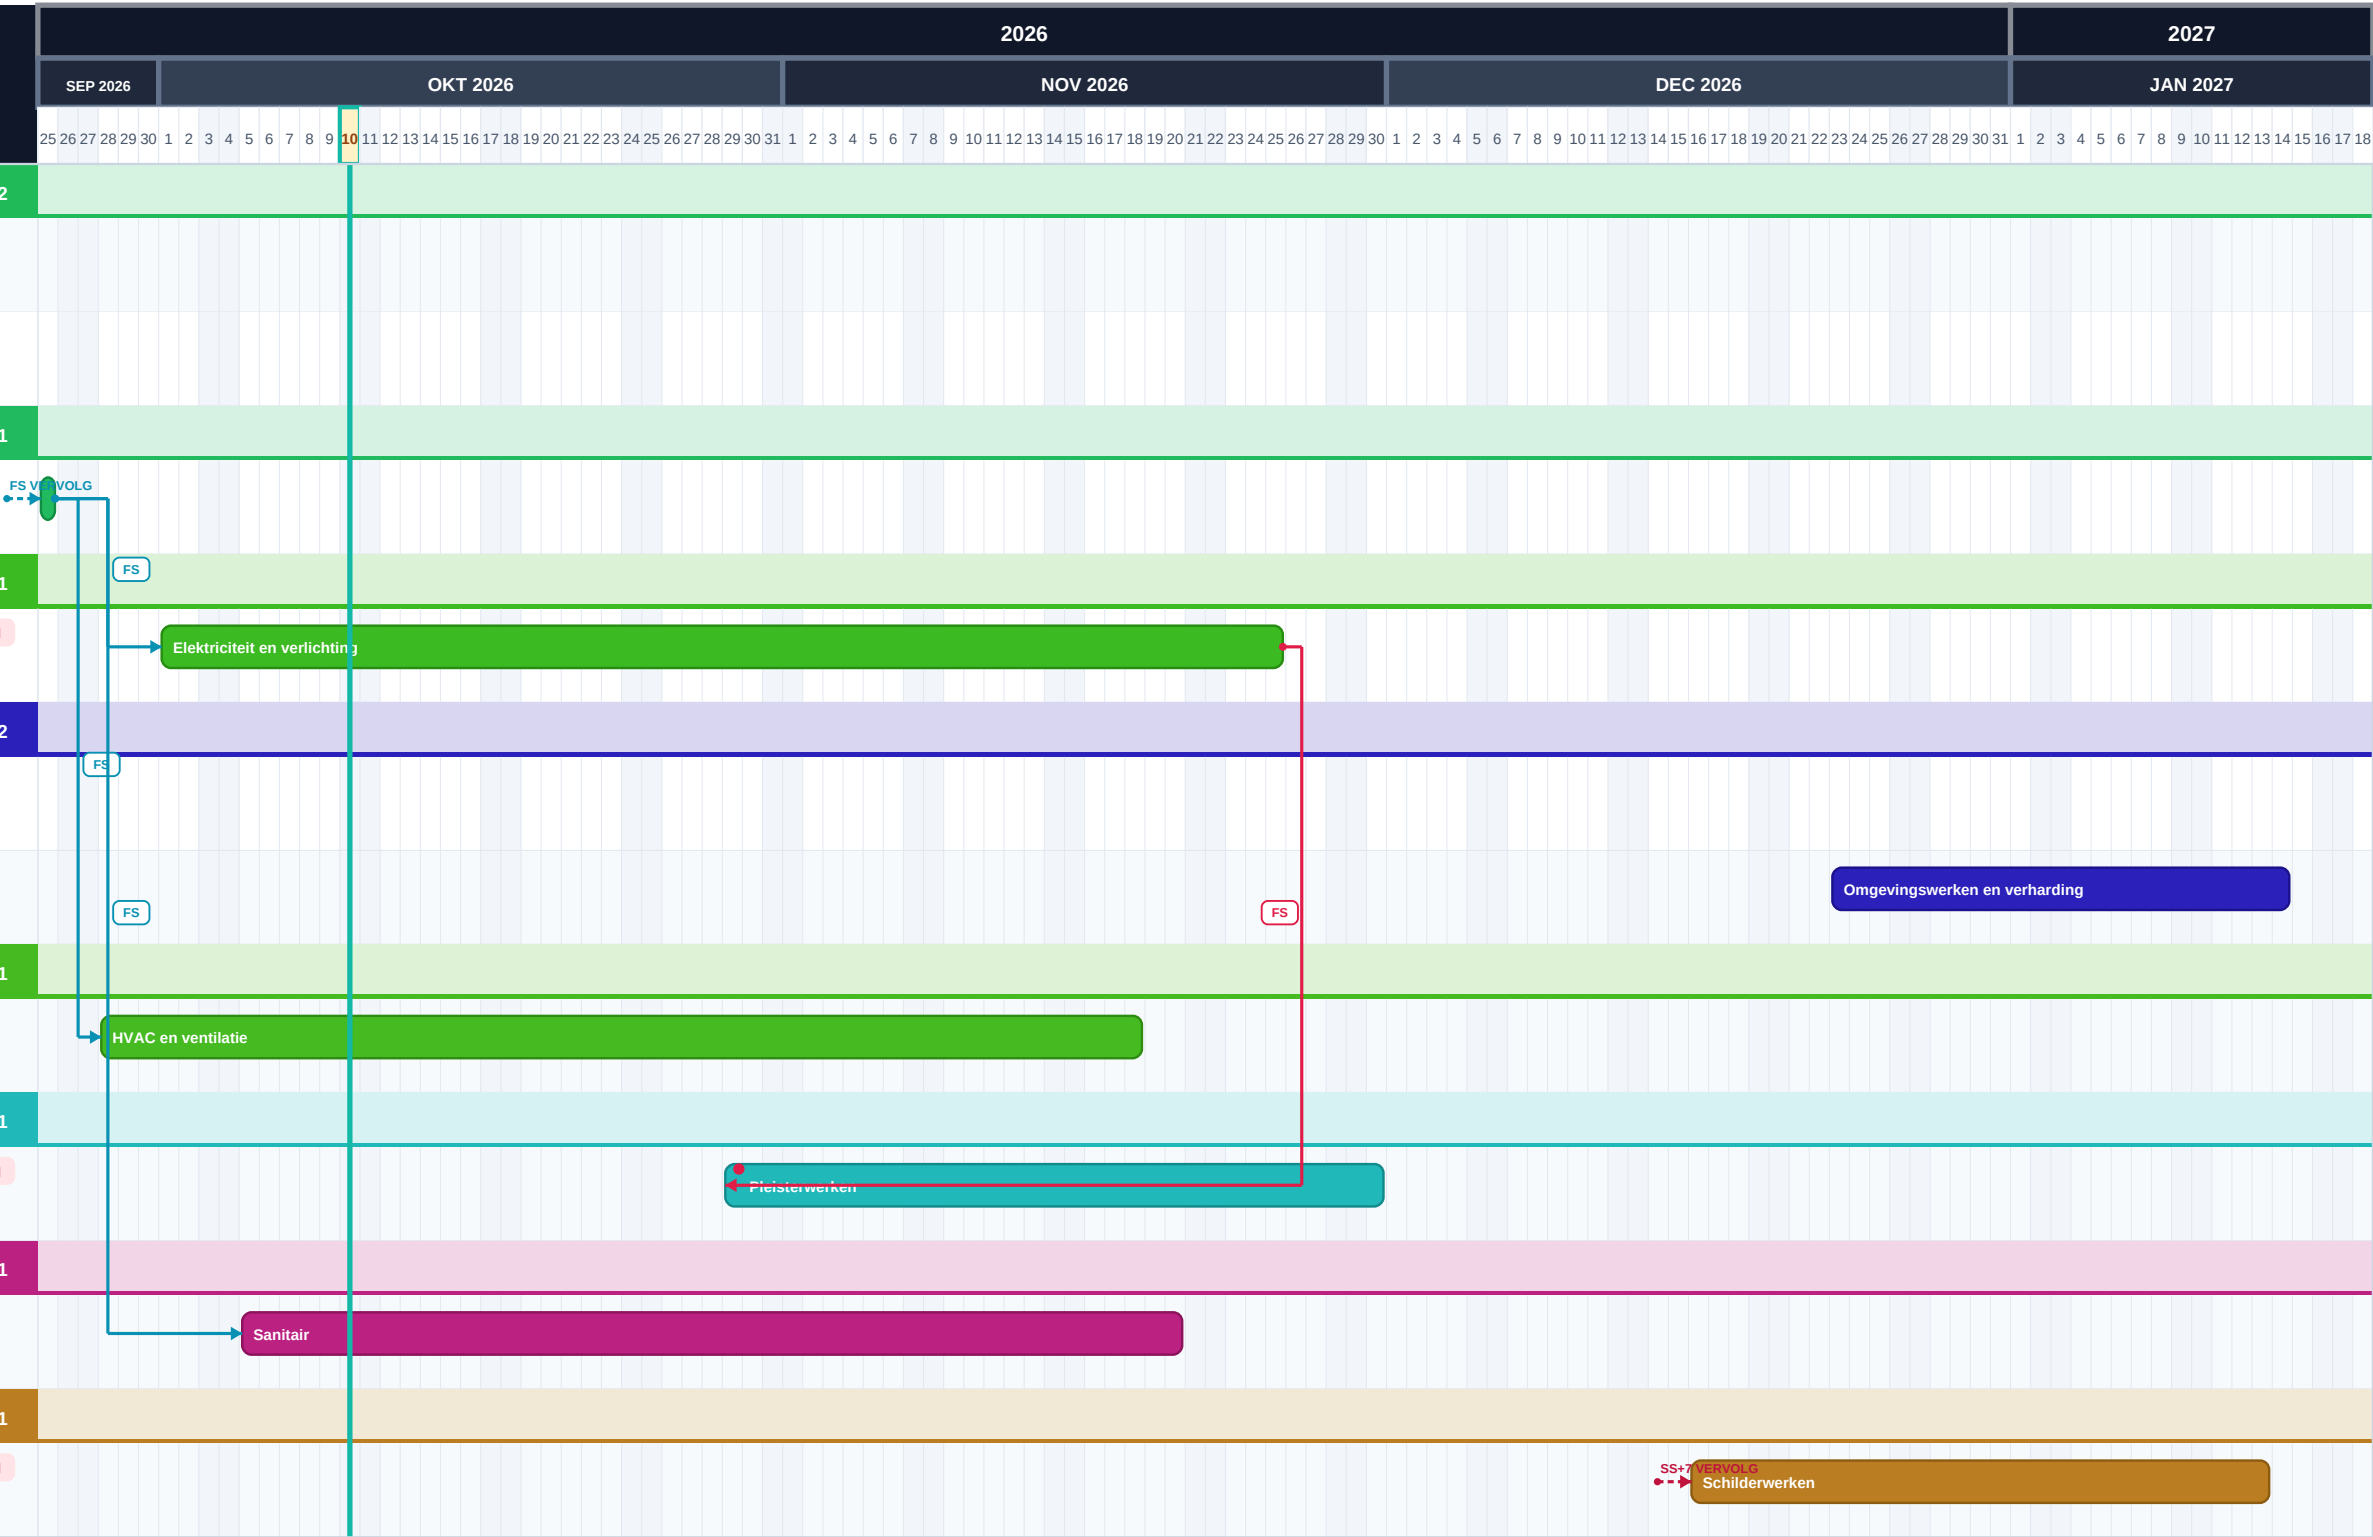

Eigen firma

Residentie Kanaalzicht | 1/6/2026 - 18/1/2027 | 232 planningsdagen

Overzicht projectplanning

Blad 3/4 | A3 liggend

BLAD 3/4

1/6/2026 - 24/9/2026 | 18/18 ingepland (100%) | 0 zonder data | 12 extern

VANDAAG

KOPPEL ES/SS/EE/SE

KRITIEKE KOPPELING

SIGNAAL

KP KP

DATA INSTELLEN

W01 OA Betonwerken

W02 OA Dakwerken

W03 OA Elektriciteit

W04 OA Grondwerken

+6 werkstromen

PERIODE 1/2 | TAKEN 11-18/18

16 KOPPELINGEN · 10 PROBLEEMEN · 5 ...

PROJECT / TAAK

2026

JUN 2026

JUL 2026

AUG 2026

SEP 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

W09 · OA Schrijnwerk

2/2

Buitenschrijnwerk aluminium

17/9/2026 - 15/10/2026

BEZIG | OA Schrijnwerk

VOLGT OP: Dakconstructie en dakisolatie FS

Binnenschrijnwerk en trappen

4/12/2026 - 31/12/2026

TE DOEN | OA Schrijnwerk

VOLGT OP: Dekvloeren en vloerisolatie FS

KP 0d

W10 · Projectbreed / intern

6/6

Werfinrichting en werkkeet

1/6/2026 - 10/6/2026

KLAAR | Eigen personeel

Bouwplaatsafsluiting en signalisatie

3/6/2026 - 9/6/2026

KLAAR | Eigen personeel

VOLGT OP: Werfinrichting en werkkeet FS

Metselwerk dragende muren

16/7/2026 - 27/8/2026

KLAAR | Eigen personeel

VOLGT OP: Funderingsplaat gewapend beton FS

Gewelsteen en voegwerk

21/9/2026 - 30/10/2026

BEZIG | Eigen personeel

VOLGT OP: Buitenschrijnwerk aluminium SS+5d

Dekvloeren en vloerisolatie

13/11/2026 - 7/12/2026

TE DOEN | Eigen personeel

VOLGT OP: Pleisterwerken SS+12d

Voorlopige oplevering

15/1/2027 - 18/1/2027

TE DOEN | Eigen personeel

VOLGT OP: 16.10 FS

Werfinrichting en werf...

Bouwplaats...

Metselwerk dragende muren

Buitenschrijnw...

FS

SS+5

Eigen firma

Pag. 3 / 4

Geëxporteerd door Gebruiker · gebruiker@voorbeeld.be · Beheerder

Aangemaakt op 10-10-2026 10:41 (2026-10-10 08:41 UTC)

© 2026 OPTIMUM – JS Technologies. Alle rechten voorbehouden.

BLAD 4/4

25/9/2026 - 18/1/2027 | 18/18 ingepland (100%) | 0 zonder data | 12 extern

VANDAAG

KOPPEL ES/SS/EE/SE

KRITIEKE KOPPELING

SIGNAAL

KP KP

DATA INSTELLEN

W01 OA Betonwerken

W02 OA Dakwerken

W03 OA Elektriciteit

W04 OA Grondwerken

+6 werkstromen

PERIODE 2/2 | TAKEN 11-18/18

16 KOPPELINGEN · 10 PROBLEEMEN · 5 ...

PROJECT / TAAK	2026																																																2027											
	SEP 2026					OKT 2026															NOV 2026															DEC 2026													JAN 2027											
	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
W09 · OA Schrijnwerk	2/2																																																											
Buitenschrijnwerk aluminium 17/9/2026 - 15/10/2026 BEZIG OA Schrijnwerk VOLGT OP: Dakconstructie en dakisolatie FS	FS VOLVOED Buitenschrijnwerk aluminium																																																											
Binnenschrijnwerk en trappen 4/12/2026 - 31/12/2026 TE DOEN OA Schrijnwerk VOLGT OP: Dekvloeren en vloerisolatie FS	KP 0d Binnenschrijnwerk en trappen																																																											
W10 · Projectbreed / intern	6/6																																																											
Werfinrichting en werkkeet 1/6/2026 - 10/6/2026 KLAAR Eigen personeel	SS+5																																																											
Bouwplaatsafsluiting en signalisatie 3/6/2026 - 9/6/2026 KLAAR Eigen personeel VOLGT OP: Werfinrichting en werkkeet FS	FS																																																											
Metselwerk dragende muren 16/7/2026 - 27/8/2026 KLAAR Eigen personeel VOLGT OP: Funderingsplaat gewapend beton FS																																																												
Gevelsteen en voegwerk 21/9/2026 - 30/10/2026 BEZIG Eigen personeel VOLGT OP: Buitenschrijnwerk aluminium SS+5d	Gevelsteen en voegwerk																																																											
Dekvloeren en vloerisolatie 13/11/2026 - 7/12/2026 TE DOEN Eigen personeel VOLGT OP: Pleisterwerken SS+12d	KP 0d ENVOLGD Dekvloeren en vloerisolatie																																																											
Voorlopige oplevering 15/1/2027 - 18/1/2027 TE DOEN Eigen personeel VOLGT OP: 16.10 FS	ENVOLGD																																																											
